

## Mala barka 2

### Radni paket I1: Uređenje interpretacijskog centra u Malom Lošinju – Nerezinama Završno izvješće

Primorsko-goranska županija



## Osnovni podaci investicije:

Odgovorni partner za radni paket: Primorsko-goranska županija

Naziv investicije: Interpretacijski centar pomorske baštine otoka Lošinja

Ukupni proračun investicije u projektu: **139.380,00 EUR<sup>1</sup>**

U sklopu projekta „Mala barka 2“ koji se provodi u sklopu Programa suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020. izvršene su aktivnosti te je dostignut rezultat, odnosno, obnovljen je, uređen i opremljen Interpretacijski centar u Malom Lošinju - Nerezinama.

Aktivnost je provedena na plovilu koji je u vrijeme provedbe aktivnosti kategoriziran kao drveni motorni brod „Dražica“ tipa lošinjski loger, sada jahta tipa lošinjski loger – Nerezinac“ (prema izvatku iz Hrvatskog Registra Brodova). Predmetni brod je u vlasništvu tvrtke Loger d.o.o., Mali Lošinj, Nerezine, Biskupija 6, OIB: 96308790087. Međusobni odnosi Primorsko-goranske županije i vlasnika su uređeni Ugovorom o korištenju drvenog motornog broda „Dražica“ u sklopu projekta Mala barka 2 (KLASA: 910-01/17-01/13, URBROJ: 2170/1-08/6-17-13) i Dodatka I. Ugovoru o korištenju drvenog motornog broda „Dražica“ u sklopu projekta Mala barka 2 (KLASA: 406-01/17-01/23, URBROJ: 2170/1-08/9-19-13). Predmetnim ugovorom o korištenju logera vlasnik je dozvolio korištenje broda za provedbu ove aktivnosti i preuzeo na sebe obveze utvrđene ugovorom sukladno pravilima projekta Mala barka 2 u periodu od 5 godina nakon dovršetka Projekta odnosno do 31. ožujka 2024. godine.

Drveni motorni brod "Dražica" bio je posljednji primjerak tradicionalne brodogradnje tipa lošinjski loger i kao takav je upisan 2010. godine (Klasa: UP-I 612-08/09-06/0263, Urbroj: 532-04-01-01/4-10-3) na listu zaštićenih kulturnih dobara Ministarstva kulture RH. Drveni motorni brod je sagrađen prije 1948. godine u nepoznatom brodogradilištu te po svojim karakteristikama reprezentativno predstavlja primjerak tradicionalnog broda te brodogradnju destinacijskog područja. Restauriranjem broda u njegovo prvobitno stanje te pretvaranje u interpretacijski centar na otvorenom, realizirana je jedinstvena turistička infrastruktura koja ostvaruje učinak na više načina. Prvenstveno obogaćuje vizualni identitet Malog Lošinja i Nerezina gdje će biti vezan te će upravo ta mjesta dobiti stalnu atraktivnu vizuru tradicionalnog jedrenjaka u tipičnim pomorskim mjestima na otoku. Lošinjski loger otvoren je i za javnost te služi kao muzej na otvorenom koji interpretira pomorsku i brodograditeljsku baštinu svoga kraja. Brod sudjeluje i na turističkim manifestacijama u sklopu kojih se održavaju regate tradicionalnih plovila. Vrijedno je naglasiti da ovakav brod dužine preko 16 metara s dva jarbola predstavlja izrazitu atrakciju i predstavlja vrijedan turistički adut svake manifestacije. Također, služiti će za održavanje raznih evenata te mladim brodograditeljima u njihovom školovanju. Po realizaciji investicije, Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, izdalo je izmjenjenu Rješenja vezanog uz svojstvo kulturnog dobra za sada „Jahtu tipa lošinjski loger – Nerezinac“ u vlasništvu Društva Loger d.o.o. Nerezine.

---

<sup>1</sup> Ukupni iznos investicije obuhvaća troškove unutar sljedećih troškovnih kategorija: vanjske stručne usluge, oprema te infrastruktura i radovi

Prekograničnim projektom Mala barka 2 osigurala se izrada dizajna i koncepta Interpretacijskog centra, obnova broda, nadzor nad obnovom broda te uređenje i opremanje Interpretacijskog centra koji je postao baza turističkih itinerara baziranih na pomorskoj baštini na otoku Lošinju. Na ovaj način povezuje se i područje otoka Lošinja koje je uključeno u zajednički prekogranični turistički proizvod Mala barka 2 te se ujedno trajno zaštićuje dio vrijedne pomorske baštine.

U okviru radnog paketa I – „Infrastruktura“ izvršenje aktivnosti u okviru radnog paketa I1 – „Uređenje interpretacijskog centra u Malom Lošinju-Nerezinama“ ostvareno je izvršenjem sljedećih aktivnosti:

- Dizajn i koncept interpretacijskog centra u Malom Lošinju - Nerezinama (T1.7.1)
- Obnova broda i opremanje interpretacijskog centra (I1.1.3)
- Nadzor uređenja broda s aspekta tradicijske gradnje
- Multimedijalna oprema (I1.1.2)

### PRORAČUN INVESTICIJE

Ukupna vrijednost uređenja ovog Interpretacijskog centra u sklopu Proračuna Projekta Mala barka 2 iznosi ukupno **139.380,00 EUR-a** i to kako slijedi:

OPIS AKTIVNOSTI	IZNOS	ISPORUČEVINA
Dizajn i koncept interpretacijskog centra u Malom Lošinju - Nerezinama	8.000,00 EUR	T1.7.1
Obnova broda i opremanje interpretacijskog centra	103.800,00 EUR	I1.1.3
Nadzor uređenja broda s aspekta tradicijske gradnje	20.000,00 EUR	
Multimedijalna oprema	7.580,00 EUR	I1.1.2
<b>SVEUKUPNO</b>	<b>139.380,00 EUR</b>	

Ukupna vrijednost uređenja ovog Interpretacijskog centra iznosi oko 405.405,00 EUR-a, te su pored finansijskih sredstava realiziranih iz Proračuna Projekta Mala barka 2, preostala sredstva osigurana iz proračunskih sredstava Ministarstva turizma RH, Grada Malog Lošinja i Turističke zajednice Grada Malog Lošinja.

### TIJEK IZVRŠENJA AKTIVNOSTI

#### Aktivnost T1.7 Dizajn i koncept interpretacijskih centara

Naziv isporučevine	Planirana količina isporučevine	Postignuta količina isporučevine
Isporučevina T.1.7.1 Dizajn i koncept interpretacijskog centra u Malom Lošinju - Nerezinama	1	1

U skladu s Ugovorom broj 08/02-16/13-1 o nabavi usluge izrade dizajna i koncepta Interpretacijskog centra Nerezine broj 08/02-16/13-1 (KLASA: 406-01/16-04/118; URBROJ: 2170/1-08/6-17-13 od 23. siječnja 2017.) i Dodatkom I. predmetnom Ugovoru (KLASA: 406-01/16-04/118; URBROJ: 2170/1-08/6-17-21 od 28. lipnja 2017.), sklopljenim s Obrtom za oblikovanje Kindin vl. Sanjin Kunić, Izvršitelj je realizirao uslugu sukladno ugovorenom, zaključno s 15. rujnom 2017. godine. Dizajnom i konceptom definirano je idejno rješenje interpretacijskog postava, odabir i postava artefakata te multimedijalni sadržaji koji će biti prezentirani multimedijalnim sredstvom.

#### Aktivnost I1.1 Uređenje logera u Malom Lošinju - Nerezinama

Naziv isporučevine	Planirana količina isporučevine	Postignuta količina isporučevine
Isporučevina I1.1.3 Obnova broda i opremanje interpretacijskog centra	1	1

Radi provedbe Aktivnosti, Primorsko-goranska županija je sklopila sljedeće ugovore o nabavi koji su uredno izvršeni:

- Ugovor o obnovi lošinjskog logera u projektu Mala barka 2: Očuvanje pomorske baštine sjevernog Jadrana, br. ugovora 08/02-17/12 (KLASA: 406-01/17-01/23, URBROJ: 2170/1-08/6-17-2); Dodatak I. ugovoru o obnovi lošinjskog logera u projektu Mala barka 2: Očuvanje pomorske baštine sjevernog Jadrana, br. ugovora 08/02-17/12
  - Izvršitelj: Lošinjska plovidba – Brodogradilište d.o.o. Mali Lošinj, Lošinjskih brodograditelja 55b, OIB: 91813936081
  - Isplaćena cijena: 90.000,00 EUR-a
  - Rok izvršenja: 20. veljače 2019. godine

Obnova je provedena sukladno planu i u skladu s troškovnikom, te se može konstatirati da su izvršeni sljedeći radovi odnosno pružene sljedeće usluge (specificirano po kategorijama obnove):

#### **TRUP I PALUBNE KUĆICE**

- Izrađeno je i ugrađeno nadgrađa s trenicama i vratima (u troškovniku soljer i bukaporte)
- Izrađeni su i ugrađeni nosači podnica i podnice
- Izrađena je i ugrađena polica (temelj) za ugradnju generatora
- Izrađen je i ugrađen poklopac motora s gumenom brtvom
- Izrađen je i ugrađen poklopac kormilarskog uređaja s brtvom
- Premazana je vanjska oplata do glavne palube završnim premazima
- Premazan je podvodni dio broda antivegetativnim premazom

#### **SNAST**

##### **Drveni dijelovi**

- Izrađeni su i ugrađeni kosnik, prikosnik i posrtaljka s pripadajućim okovima
- Izrađene su i ugrađene sidrene sohe s pripadajućim okovima
- Izrađeni su i ugrađeni dva jarbola s nastavcima i koševima, te pripadajućim okovima i jabukama na vrhu

4. Izrađene su i ugrađene drvene razmaknice (ujedno nosači za palce/kavije)
5. Izrađena su i ugrađena dva deblenjaka i dva sošnjaka s hajmicama i pripadajućim okovima
6. Izrađena je i ugrađena pramčana bitva
7. Izrađene su i ugrađene pramčane i krmene kaštanjole
8. Izrađene su i ugrađene dodatne kaštanolje na krmi (umjesto krmernih bitvi)
9. Izrađen je i ugrađen branduna na pramčanoj razmi sa zjevalicama
10. Izrađeni su i ugrađeni dva grla jarbola na palubi (s klinovima i platnenim ovratnikom)
11. Izrađena su i ugrađena dva temelja jarbola na pasmi
12. Nabavljeno je i ugrađeno kormilarsko kolo i pult
13. Izrađen je brodski siz

**Užad snasta, čelična užad snasta, lanci**

14. Nabavljena je i postavljena sintetička užad snasta
15. Nabavljena je i postavljena čelična užad snasta
16. Nabavljeni su i postavljeni lanci (za vodno leto i sidrene predgone)

**Jedra**

17. Nabavljena su jedra (dva sošna jedra, dva vršna jedra i četiri prečke) s pripadajućim letnim prstenima

**Koloturi, škopci, stegači, srcolike metalne omče, ostali okovi**

18. Nabavljeni su i postavljeni koloturi
19. Izrađeni su i postavljeni koloturi, fiksni koloturi za podizanje sidra, šuplje glave (bigote) s pripadajućim okovima i klinovima/kavije
20. Nabavljeni su i postavljeni škopci
21. Nabavljene su i postavljeni metalni stegači (zateznice)
22. Nabavljene su i postavljene srcolike metalne omče (radanče)
23. Izrađena su i ugrađena proširenje oko jarbola za naslanjanje deblenjaka s okovom
24. Izrađene su i ugrađene željezne trake za prihvat donjih šupljih glava (lande)

**OSTALO**

1. Izvršen je inicijalni pokus nagiba
2. Ponovno je podignut brod iz mora radi povlačenja vodne linije i završnog bojanja trupa







2. Ugovor o pružanju usluge nadzora obnove barki/broda broj 08/02-17/11/ 1 i 2 (KLASA: 406-01/17-04/63, URBROJ: 2170/1-08/6-17-10) – Grupa 2; Dodatak I. Ugovoru o pružanju usluge nadzora obnove barki/broda broj 08/02-17/11/ 1 i 2 (KLASA: 406-01/17-04/63, URBROJ: 2170/1-08/8-18-44) – Grupa 2
  - Izvršitelj: Pomorski fakultet u Rijeci, Studentska 2, Rijeka, OIB: 76722145702
  - Isplaćena cijena: 20.000,00 EUR-a
  - Rok izvršenja: 28. veljače 2019. godine

Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci je sukladno zahtjevima iz Ugovora o pružanju usluge nadzora obnove barki/broda završio s aktivnostima vezanim uz savjetovanje i nadzor nad obnovom barki/broda. Prema ugovornim obvezama, provoditelj savjetovanja i nadzora dužan je izvršavati nadzorne preglede i savjetovati brodograditelja u procesu obnove, te o tome pisanim izvješćem obavještavati naručitelja. Relevantni stručnjaci Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci nakon što su obavili nadzorne međupreglede MP5 L (1.08.2018.), MP6 L (13.09.2018.), MP7 L (21.09.2018.), MP8 L (19.10.2018.), MP9 L (14.11.2018.), MP10 L (11.11.2018.), MP11 L (28.12.2018.), MP12 L (31.01.2019.), MP13 L (7./8.02.2019.), MP14 L (15.02.2019.), MP15 L (22.02.2019.) i MP16 L (26.02.2019.) obavili su 27. 02.2019. 3. i završni nadzorni pregled lošinjskog logera u Malom Lošinj. Osim obavljenih nadzornih pregleda i međupregleda relevantni stručnjaci Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci kontinuirano su provodili savjetovanje vezano uz obnovu broda s projektantima, brodogradilištem, brodograditeljem i prijaviteljem.

3. Ugovor o nabavi robe i usluga u projektu Mala barka 2 – Interpretacijski centar u Nerezinama, Grupa 1. Nabava usluge postavljanja i uređenja, evidencijski broj: 08/02-18/02 (KLASA:406-01/18-04/85, URBROJ: 2170/1-08/8-18-9); Dodatak I. Ugovoru o nabavi robe i usluga u projektu Mala barka 2 – Interpretacijski centar u Nerezinama, Grupa 1. Nabava usluge postavljanja i uređenja, evidencijski broj: 08/02-18/02 (KLASA: 406-01/18-04/85, URBROJ: 2170/1-08/8-18-12)
  - Izvršitelj: Surogat d.o.o. Rijeka, Bosiljke Rakić 7, OIB: 15246690017
  - Isplaćena cijena: 13.800,00 EUR-a
  - Rok izvršenja: 28. veljače 2019. godine

Izvešće o realiziranom Ugovoru:

R. BR	NAZIV UGOVORENE USLUGE	SAŽETAK OBUHVATA USLUGE
1.	<b>IZRADA ELEMENATA POSTAVA (NAMJEŠTAJ)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Izrada, dobava i postavljanje <b>Oplate L</b> dimenzija 300x160 cm od borovih dasaka 1. klase, različitih širina, debljine 15 mm</li> <li>Izrada, dobava i postavljanje <b>Oplate D</b> dimenzija 500x160 cm od borovih dasaka 1. klase, različitih širina, debljine 15 mm</li> <li>Izrada, dobava i postavljanje <b>Klupe L</b> dimenzija 250x40x45 cm</li> <li>Izrada, dobava i postavljanje <b>Klupe D</b> dimenzija 470x40x45 cm</li> <li>Izrada, dobava i postavljanje <b>Metalnog okova</b> za prihvat drvenih oplata <b>L i D</b> od crnog lima debljine 3 mm</li> <li>Izrada, dobava i postavljanje <b>Metalnih okova</b> za prihvat klupa <b>L i D</b> od crnog lima debljine 3 mm</li> </ul>
2.	<b>USLUGE IZRADE AUDIO SUSTAVA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Programiranje i osnovna obuka zaposlenika korisnika za rukovanje kompletnim sustavom za višejezičnu prezentaciju tematskih cjelona iz nacrtne dokumentacije</li> <li>Produkcija: organizacija, snimanje i izrada višejezične prezentacije karakterističnih tematskih cjelina postava na 5 jezika</li> <li>Vokali: naknada za naratore sadržaja tematskih cjelina na hrvatskom i stranim jezicima: njemački, engleski, talijanski, slovenski</li> </ul>
3.	<b>USLUGE PRIJEVODA, ILUSTRIRANJA, PRINTANJA I NABAVE ARTEFAKATA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Grafička obrada fotografija</li> <li>Grafička priprema za isprint panela iza lijeve i desne oplate</li> <li>Izrada 2D ilustracija u tehničkim tuša ili grafita odgovarajućih motiva na temu ruta, terete, posade, hrane i brodogradnje</li> <li>Oblikovanja panoa na Rivi na temu "Što je loger"</li> <li>Izrada, dobava i postavljanje panoa na Rivi formata A0, lagane drvene konstrukcije</li> <li>Izrada prijevoda tekstova za sve potrebne opise postava</li> <li>Izrada, dobava i postavljanje <b>artefakata</b>: <ul style="list-style-type: none"> <li><b>Brodogradnja</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Drveni bat za kalafatanje (dio alata za šuperenje)</li> <li>- Ručno svrdlo</li> <li>- Šegac (ručna pila za drvo)</li> <li>- Rašketa (strugalo za boju i vegetaciju s oplate broda)</li> </ul> </li> <li><b>Rute</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Navigacijski šestar</li> <li>- Kompas</li> </ul> </li> <li><b>Tereti</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uzorci drvenog tereta</li> </ul> </li> <li><b>Hrana</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Drvena bačvica</li> <li>- Metalna posuda</li> <li>- Suhe uši prasca</li> <li>- Baškoti</li> </ul> </li> <li><b>Posada</b></li> </ul> </li> </ul> <p>Kutija s osobnim stvarima sadrži:</p>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Molitvenik</li> <li>- Ogledalce</li> <li>- Tintarnica</li> <li>- Upaljač benzinski</li> <li>- Kutijica sa lijekom (pastiljama)</li> <li>- Staklena bočica</li> </ul>
--	--	---

U nastavku prilažemo nekoliko fotografija realizirane usluge postavljanja i uređenja Interpretacijskog centra pomorske baštine otoka Lošinja:





Naziv isporučevine	Planirana količina isporučevine	Postignuta količina isporučevine
Isporučevina I1.1.2 Multimedijalna oprema	1	1

Radi provedbe Aktivnosti, Primorsko-goranska županija je sklopila je sljedeći ugovor o nabavi koji je uredno izvršen:

1. Ugovor o nabavi robe i usluga u projektu Mala barka 2 – Interpretacijski centar u Nerezinama, Grupa 2. Nabava robe za opremanje, evidencijski broj: 08/02-18/02 (KLASA:406-01/18-04/85, URBROJ: 2170/1-08/8-18-10); Dodatak I. Ugovoru o nabavi robe i usluga u projektu Mala barka 2 – Interpretacijski centar u Nerezinama, Grupa 2. Nabava robe za opremanje, evidencijski broj: 08/02-18/02(KLASA: 406-01/18-04/85, URBROJ: 2170/1-08/8-18-13)

- Izvršitelj: Surogat d.o.o. Rijeka, Bosiljke Rakić 7, OIB: 15246690017
- Isplaćena cijena: 7.580,00 EUR-a
- Rok izvršenja: 28. veljače 2019. godine

Realizirana je dobava i postavljanje multimedijalnog sadržaja u prostor Interpretacijskog centra, a specifikacija ugovorenih usluga i opreme obzirom na izrađen dizajn i koncept interpretacijskog centra slijedi u nastavku:

R. BR.	NAZIV UGOVORENE USLUGE	SAŽETAK OBUHVATA USLUGE
1.	<b>AUDIO SUSTAV</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sampler sustav za višejezičnu prezentaciju, smješten u drvenoj kutiji, opremljen starom telefonskom slušalicom i kompletom za napajanje, komplet 5 komada,</li> <li>2. 4 kanalno pojačalo komad 1,</li> <li>3. 4 kanalna matrica, komplet – 1,</li> <li>4. višekanalni svirač za višekanalnu 3D zvučnu instalaciju komplet – 1,</li> <li>5. Kablovi za spajanje i instalacija, komplet – 1</li> <li>6. Kutije za pojačalo i svirače,</li> <li>7. usluge ožičavanja i spajanja opreme komplet</li> </ol>
2.	<b>ELEKTROINSTALACIJA RASVJETE</b>	<p>Nabava, isporuka, montaža opreme:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. LED traka m – 20</li> <li>2. LED napajanje kom – 2</li> <li>3. Dvostruki prekidač kom – 1</li> <li>4. Vod / kabel, kom – 1</li> <li>5. Reflektor GS13, kom – 6</li> <li>6. LED napajanje, kom – 1</li> </ol>



Multimedijski sustav na brodu Loger sastoji se od centralno smještene opreme ispod ulaznih stepenica, lokalno smještenih „sampler“ jedinica oko svake tematske cjeline te video prezentacije na monitoru nasuprot ulaza. Dio multimedijskog sustava je i rasvjeta koja se sastoji od LED traka i LED reflektora u samom prostoru instalacije.


Pokretanje sustava započinje na centralno smještenoj razvodnoj kutiji 220Vgdje uklapanjem osigurača pokrećemo napajanja za rasvjetu, audio player i sampler lokalne kutije. Pritiskom na prekidač audio player starta audio prezentaciju u prostoru.

Sustav multimedije je jednostavan i lako popravljiv u slučaju kvara jer koristi dostupna napajanja. Sustav video prezentacije odvojen je i napaja se na centralnoj razvodnoj ploči gdje se napaja i ostali sustav multimedije preko razvodne kutije instalacija.

U nastavku dajemo prikaz cjelokupne opreme u Interpretacijskom centru:





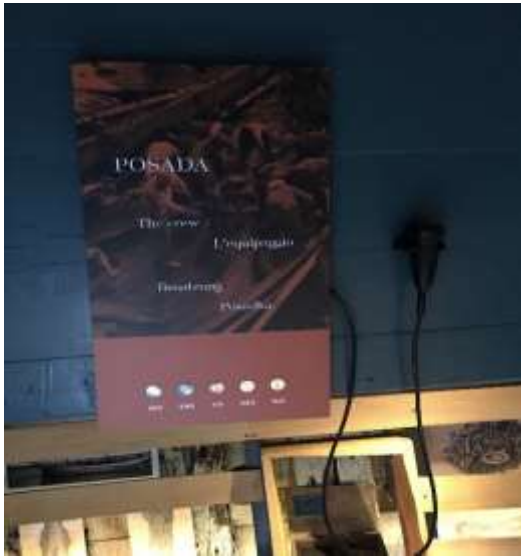

Slijedom navedenog, Aktivnost je u cijelosti provedena u trenutku kada su pružene usluge i isporučena roba nabavljene ovim ugovorima odnosno 28. veljače 2019. godine.

## ZAKLJUČNA RAZMATRANJA

Planirane aktivnosti izvršene su, sukladno planu i ugovorenim rokovima te je 27. lipnja 2019. godine organizirano svečano otvorenje Interpretacijskog centra pomorske baštine otoka Lošinja.

Svečano otvorenje održalo se u Malog Lošinja, ispred Muzeja Apoksiomen te je istog dana uoči svečanog otvorenja održana i Završna konferencija projekta u sklopu koje su prezentirani sveukupni rezultati i postignuća Projekta Mala barka 2 iz Program suradnje Interreg V-A Slovenija-Hrvatska 2014.-2020.

Na samom događaju, uz predstavnike projektnih partnera i članova centra izvrsnosti Male barke, županijskih upravnih tijela, izvršne vlasti Grada Malog Lošinja i lokalne turističke zajednice, nazočili su i predstavnici brojnih institucija – ministar turizma Gari Cappelli i suradnici, gradonačelnici i općinski načelnici, predsjednici općinskih i gradskih vijeća, direktori turističkih zajednica, ravnatelji muzejskih ustanova, predstavnici pomorskog sektora, obrazovnih institucija te predstavnici Ureda Vlade Republike Slovenije za razvoj i europsku kohezijsku politiku, ali i brojni sugrađani i zainteresirani turisti. Uz svečano otvorenje, prisutni su imali priliku razgledati Interpretacijski centar pomorske baštine.

U nastavku prilažemo fotografije sa svečanog otvorenja:









**Glavni ishodi projekta:**

Glavni ishod projekta O.I1.1 - Uređen interpretacijski centar u Malom Lošinju - Nerezinama

<b>Pokazatelj programskog ishoda</b>	<b>Predviđeni količinski doprinos:</b>	<b>Ostvareni količinski doprinos:</b>
CO09 Povećanje u očekivanom broju posjeta podržanim odredištima kulturne ili prirodne baštine i ostalim atrakcijama	10000	<i>Prema potvrđenoj metodologiji broj posjeta će se brojati do 31.08.2019 te će biti uključen u završno izvješće o napretku projekta</i>
6c-1 Investicije malih razmjera u posjetiteljsku infrastrukturu i očuvanje prirodne i kulturne baštine	1	1



## **DODANA VRIJEDNOST PROJEKTU I PREKOGRANIČNOJ TURISTIČKOJ DESTINACIJI MALA BARKA 2**

U sklopu projekta Mala barka 2 ostvaren je atraktivan Interpretacijski centar pomorske baštine otoka Lošinja, smješten u potpalublju lošinjskog logera „Nerezinac“, koji je privezan na Obali lošinjskih kapetana ispred Muzeja Apoksiomena, a koji na suvremen, zanimljiv i interaktivan način prikazuje i interpretira dugu i bogatu pomorsku tradiciju ovoga kraja.

Drveni motorni brod “Dražica” (nakon obnove preimenovan u „Nerezinac“) je vrijedan primjerak tradicionalne brodogradnje i od 2010. godine na listi zaštićenih kulturnih dobara Ministarstva kulture RH. Jedrenjak je obnovljen po uzoru na lošinjske logere s kraja 19. st. Restauriranjem broda te njegovom preobrazbom u interpretacijski centar, ostvarena je jedinstvena turistička infrastruktura - muzej na otvorenom, koji doprinosi vizuri tipičnih pomorskih otočnih mjesta sjevernog hrvatskog Jadrana.

Muzeološki postav upućuje na značajke svakodnevnog života na brodu krajem 19. stoljeća. Međutim, pored općih informacija o takvom tipu brodova, vremenu u kojem su nastali i korišteni kao i o tipu tereta koji je bio uobičajen, postoji vrlo malo izravnih podataka upravo o ovom brodu: povijest ‘Nerezinca’ je gotovo potpuna nepoznanica. Stoga se njegova zagonetna prošlost nametnula kao potka prilikom osmišljavanja postava. Kad pred sobom imamo samo naznaku, vrh sante leda ili zagonetku, um sam od sebe pokreće priču koja nedostaje. Kada je brod sagrađen i tko ga je gradio? Tko su bili kapetani i mornari koji su plovili ovim brodom? Kakve je anegdote preživio tijekom svog dugog trajanja?

Postav se sastoji od dijela postavljenog na rivi ispred broda, dijela na palubi broda i dijela postavljenog unutar broda u potpalublju (bivšem skladištu – štivi).

Multimedijalni postav u potpalublju prikazuje život na brodu kroz pet karakterističnih tematskih cjelina: posada, hrana, tereti, pomorske rute te gradnja i održavanje broda. Osim činjenica koje mu se nude, posjetitelja se poziva na zamišljanje mogućih priča i scenarija. Pored fotografija i autentičnih predmeta, ilustracije i tekstualni zapisi nude naznaku moguće povijesti broda. Nepotpuna, fragmentarna i imaginarna povijest broda shvaćena je kao prilika za propitivanje autentičnosti povijesti i tradicije, koju najčešće olako uzimamo kao nepobitnu činjenicu.

Postav na obali (rivi) i palubi (koverti) sadrži informativnu ploču s osnovnim podacima o brodu te dio nazvan ‘radionica’ - konstrukcija slična stolarskom stolu, na kojem posjetioci mogu isprobati neke od vještina tradicijske brodogradnje, održavanje broda, ili na palubi vezano uz mornarske vještine ili upravljanje brodom: šuperenje (kalafatanje), krpanje jedara, blanjanje, brušenje, zabijanje čavli, krivljenje drva (na paru), vezanje mornarskih čvorova, ribanje palube (kuverte), puhanje u rog, podizanje posjetitelja preko koloturnika (paranki), podizanje jedra i sl.

Autorica muzeološkog koncepta je kustosica Katarina Mažuran, prof., dok projekt postava potpisuju Sanjin Kunić, dipl. dizajner i Luka Jelušić, MFA dizajner.

Brod sudjeluje i na turističkim manifestacijama u sklopu kojih se održavaju regate tradicijskih plovila. Ovaj “drugačiji” interpretacijski centar pomorske baštine na brodu koji nije samo usidren ili privezan već i plovi, možete sresti na raznim mjestima - lučicama itinerara Mala barka ili negdje dok plovite sjevernim Jadranom.

Svi elementi pomorske baštine primjereno su označeni jednoobraznom markacijom koja upućuje na turističke atrakcije, a koja slijedi vizualni identitet turističkog proizvoda Mala barka.

Zaključno, rezultat izvršenja aktivnosti uređenja Interpretacijskog centra u Malom Lošinj - Nerezinama dokaz je koliko je lokalna zajednica i cijela regija svjesna, kako potrebe održivog razvoja i očuvanja kulturnog identiteta, tako i važnosti turističke valorizacije pomorske baštine.

## **TRAJNOST I PRENOSIVOST ISPORUČEVINE**

### **SPORAZUM O KORIŠTENJU DRVENOG MOTORNOG BRODA "DRAŽICA" BEZ NAKNADE**

Dana 8. ožujka 2016. godine sklopljen je Sporazum između Primorsko-goranske županije, tvrtke Loger i Grada Mali Lošinj vezano uz korištenje *drvenog motornog broda "Dražica"* u vlasništvu trgovačkog društva Loger d.o.o., u svrhu provedbe projekta „Mala Barka 2“. Županija se obvezala restauracijom urediti drveni motorni brod „Dražica“ *te ga dovesti u funkciju interpretacijskog centra na otvorenom čime se realizirala jedinstvena turistička infrastruktura koja obogaćuje vizualni identitet Nerezina i Grada Malog Lošinja*. Županija će predmetni motorni brod koristiti isključivo za potrebe postavljanja stalne izložbe (postava) pomorske baštine kao sastavnog dijela interpretacijskog centra kojom će se unaprijediti turistička ponuda i osigurati promocija pomorske i brodograditeljske baštine. Grad Mali Lošinj se sukladno predmetnom Sporazumu i pismu namjere obvezao *održavati prostor, opremu i elemente stalne izložbe na i u predmetnom motornom brodu* u razdoblju od 5 (pet) godina od završetka Projekta.

### **UGOVOR O KORIŠTENJU DRVENOG MOTORNOG BRODA „DRAŽICA“ U SKLOPU PROJEKTA MALA BARKA 2**

Temeljem sklopljenog Sporazumu pristupilo se sklapanju predmetnog Ugovora. Ugovorom o korištenju drvenog motornog broda „Dražica“ u sklopu projekta Mala barka 2 i Dodatka I. Ugovoru, vlasnik Loger d.o.o., Mali Lošinj, Nerezine, Biskupija 6, OIB: 96308790087 je dozvolio korištenje broda za provedbu ove aktivnosti i preuzeo na sebe obveze utvrđene ugovorom sukladno pravilima projekta Mala barka 2 u periodu od 5 godina nakon dovršetka Projekta odnosno do 31. ožujka 2024. godine.

Vlasnik se obvezao nakon dovršetka projekta preuzeti Interpretacijski centar i zadržati ga u prvotnom stanju u roku od 5 godina od dovršetka Projekta što uključuje uređenje i opremu sukladno dizajnu i konceptu.

Grad Mali Lošinj je obvezan financirati troškove održavanja prostora, opreme i elemenata stalne izložbe u Interpretacijskom centru u istom stanju i s istom namjenom u roku od 5 godina od dovršetka projekta, kao i tekuće režijske troškove kao što su troškovi isporuke električne energije, isporuke vode, usluge telefonskih operatera i slično.

Vlasnik će koristiti loger za daljnji razvoj i promociju pomorske baštine, razvoj i provedbu turističkih proizvoda na temu pomorske baštine i Male barke 2 te u obrazovne svrhe sukladno Projektu minimalno u roku od 5 godina od dovršetka Projekta.

Vlasnik ne smije koristiti Interpretacijski centar u komercijalne svrhe i ostvarivati neto prihode od korištenja Logera u roku od 5 godina od dovršetka Projekta.

Realizacijom budućih sličnih projekata (otvaranje interpretacijskih centara pomorske baštine) na prekograničnom području, a i šire, na EU području, moguće je povezivanje, daljnja promocija i unaprjeđenje dosadašnjih projektnih ishoda i rezultata.

